

Møte:	Avsluttende møte med deltakere i medvirkningsgruppen – Foreldreovernatting	Prosjekt:	Rokade C1
Møtedato:	11.05.23	Sted:	Bergvillaen RH
Referent:	Thea Ekren Koren		

Møtedato: 11.05.2023 14:00

Plassering: Bergvillaen RH

Invitasjonsmelding

Nå med Teams mulighet, men vi ønsker fysisk deltakelse der det er mulig

Hei

Dere har medvirket i Rokade C1 på ovennevnte delprosjekt.

Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet. OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).

Dere inviteres i denne forbindelse til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.

Agenda:

- Gi status for delprosjektet*
- Oppsummere aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring.*

Vel møtt

Deltakere (Skjul)[Stian Ilebrekke](#) (Møtearrangør)[Morten Syversen](#)[Emilie Johanne Sosa Berge](#)[Koren, Thea](#)

Bjørn Aage Feet

Martin Lieungh

[Per Oddvar Synnes](#)

Referat fra møtet

Sak 1 Oppsummere status for delprosjektet i Rokade C1

Velkommen til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.

- Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet.
- Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet.
- OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen.

Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).

Det ble gitt informasjon om de endringer i medvirkning/samhandlingsansvar som er overført fra OUS til HSØ PO.

Følgende medvirkning er gjennomført for prosjektet:

- 15.06.2022 - Brukermøte 1 Modulbygg

Presentasjon av løsningene, tegninger ved prosjektleder Emilie Johanne S. Berge

Foreldreovernatting flyttet først fra E4 til pasienthotellet, der pasienthotellets møbler og inventar benyttes. Areal med trimrom og badstue osv. utgår i eksisterende bygg E4, dette arealet har ikke blitt benyttet, her er det planlagt med tekniske rom og infrastruktur for de nye funksjonene i bygget E4. Foreldreovernattingen er planlagt at skal flytte fra pasienthotellet til E7 (nytt modulbygg) og til de eksisterende familieovernattingsrommen i bygg E4,

plan 05 (nå fraflyttet pga. byggearbeider i andre etasjer i bygg E4). Her er tidligere inventar kastet. Det er planlagt totalt 57 foreldreovernattingsrom totalt, 43 nye i modulbygg E7 (fordelt over tre plan) og 15 stykker i E4, plan 05.


Bygg E7 er ikke planlagt med matforsyning, men det er laget plan for forsyning rent og urent tøy, renholdsrom og oppholdsrom. Det er planlagt med HC parkering og drop-off sone utenfor inngangen.

Det var i eksisterende bygg enkeltrom for foreldreovernattingen, nå er det planlagt med hovedsakelig to-sengsrom og noen få enerom, det er også planlagt for noen større familierom.

Foreløpig tegninger og illustrasjoner bygg E7:



Bygg E7, plan 01:

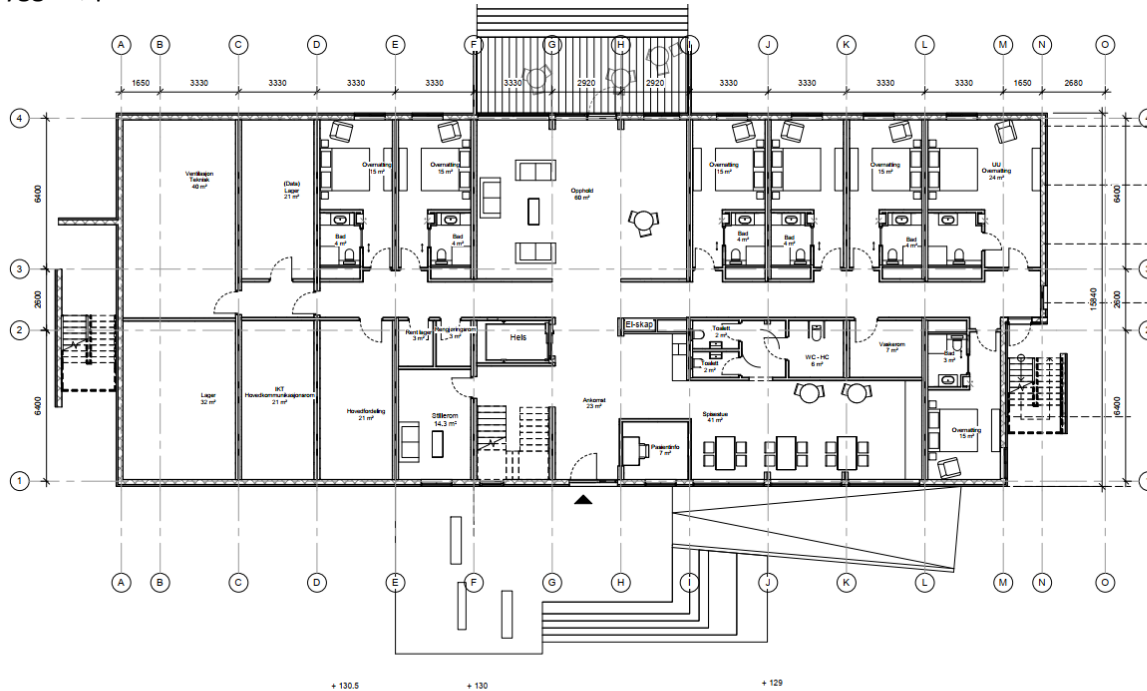

SOGNVANNSEIEN

Plan 01 50
Målestokk: 1 : 100

FORELØPIG TEGNING
09.12.2022 13:06:54


B.2	Endringer med CE	RAT	JEB	IMP	Dato 2
B.1	Forprosjekt	RAT	JEB	IMP	31.08.22
REV	REVISJONEN/OMSKEDS	FBERAT	SJOBY	TROND	DAYO

ERETTER TEGN.NR.:	A REF:
TEGNINGSBLISTE:	FILNAVN:

RENDOKNR:	BYGGNR:	ETG:	FAO:	BYGGINGSIDEL:	TYPE:	LØPENUMR.:	REV.:
03056 C7 1 A 200 21 001							B.2

Modulbygg C7
Plan 01
Foredreovernatting

FASE / PROSJEKTFORDELSE:	RI SKYNAVSPOR:
FORPROSJEKT	83821

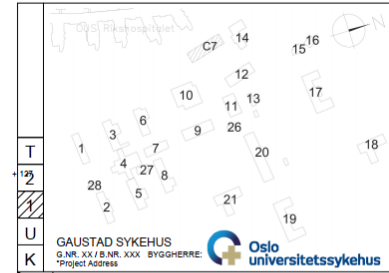


ANR	RATIO arkitektur AS - Drammensveien 136 C1, 0277 Oslo
ARB	*RB Navn - *RB Adresse
BY	*BY Navn - *BY Adresse
VE	*VE Navn - *VE Adresse
HE	*HE Navn - *HE Adresse

Ratio
Drammensveien 136 C1
N:027702LD 40741 52 11 11

SAKSNR:	ARBYNDR:	TEGN. AV:	GR. LED:	DATO OPPF.:	DATO REV.:	RIKSPROJEKT:	RIKSTEGNUNG:
83821	JEB			31.08.22		A1	1:100

Bygg E7, plan 02, som også er planlagt lik for plan 03

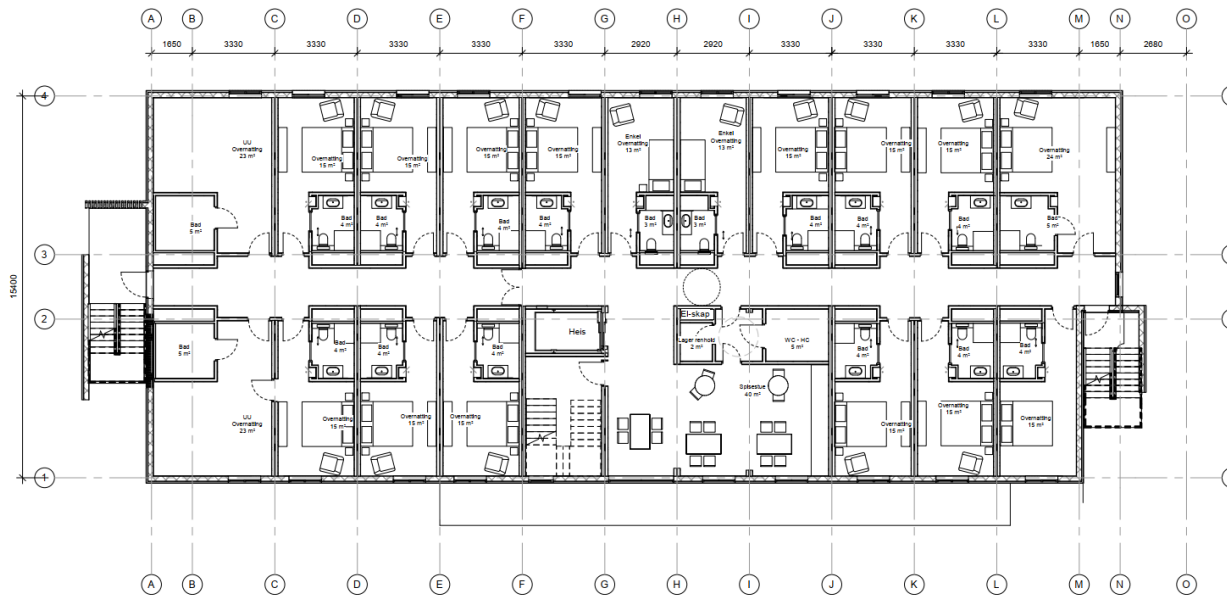

FORELØPIG TEGNING
09.12.2022 13:08:19

B.2	BRUKSFORMER FOR OS	RAT	JER	OMR 2	
B.1	Forprosjekt	RAT	MO	31.08.22	
REV	REVISJONEN/GJELDER	FARNA	SIGN	KONT	DATA

BRUKTATTEN TEGN NR.: X REF:

TEGNINGSLESTE: FILNAVN:

SENDINGNR. BYGGNR. ETS. FAG BYGNINGSDEL. TYPE LØPENR. REV.

03056 C7 2 A 200 21 001 | B.2

Modulbygg C7
Plan 02
Foredreovermatting

FASE / PROSJEKTBEKRIVELSE: FORPROSJEKT RØ SKANNINGSPOR: 83821

T
1
U
K

GAUSTAD SYKEHUS
G.NR. XX / B.NR. XXX BYGGHERRE:
*Project Address

Oslo universitetssykehus

Bygg E7, plan 04 er planlagt med mulighet for kontorer og møterom.

Klinikkontaktene er Nye OUS sitt kontaktpunkt inn mot den enkelte klinikk. Deltakere til en overordnet medvirkningsgruppe og særgrupper innen enkelte delprosjekter vil bli innmeldt etter samme mal som i forprosjektet. Ytterligere behov for kontaktpunkter inn mot den enkelte klinikk etableres via Nye OUS og klinikkontaktene. Medvirkning via de brukergrupper som ble benyttet i forprosjektet, er avsluttet.

Fremdrift ble presentert – innflytting C7 planlagt siste kvartal i 2024. Anskaffelse planlagt etter sommer 2023, nabovarsel sendt og rammesøknad sendes juni 2023. Bymiljøetaten eier tomten, avtale om leie må inngås.

Sak 2 Oppsummering av aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring

- Det er ikke avklart hvor spiseteamet skal være videre, har pågått rokade og det presenteres i møtet at det ikke er funnet erstatningsareal for denne funksjonen. (Barn som har levd med sonder, PEG, svelgpareser osv. Dette er dagpasienter og behandling skjer i tverrfaglig team.) Nye OUS følger opp denne med gjennomgang av beslutninger og kontakter evt. klinikkontakter ved behov for avklaringer.
- Medvirkning er avsluttet, gjennomgang av arealer for å kvalitetssikre romfunksjonene og utstyr gjøres av Nye OUS i samarbeid med HSØ PO. Klinikkontakter blir kontaktet ved behov for evt. avklaringer.
- Plan for utstyr til eksisterende foreldreovernatting må avklares med OUS og evt. arealforvalter.
