

# Rokade C1

## Forberedende arbeider og byggeplassskiller

Medvirkningsmøte  
27. november 2024





# Rokade C1




# Agenda

- 14.00 - 14.00 Velkommen v/ Martin Lieungh, OUS
- 14.00 – 14.05 Godkjenning av referat fra forrige møte v/ Thea Koren, HSØ PO
- 14.05 – 14.15 Status: bygging Rokade C1 med fremdriftsplan v/ Stian Ilebrekke, HSØ PO
- 14.15 – 14.35 Status: mottaksprosjekt med fremdrift for flytting v/ Lorang Åstorp, OUS
- 14.35 – 14.45 Avklaringer/særmøter v/ Martin Lieungh, OUS
  - 1) Portørstue
  - 2) Endelig løsning kantine

## Forberedende arbeid

- 14.45 – 15.30 Tema: Rivearbeid C1 v/ Thea Koren, HSØ PO





# Godkjenning av referat fra gjennomførte møter

- Møte 7, 19.06.2024
- Møte 8, 18.09.2024

Referater fra alle grupper:

[Medvirkning rocade C1 Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus HF](#)

# Status: Rokade C1 med fremdriftsplan

Prosjekt	Status fremdrift
<b>R81 Vaktmesterentreprisen (pågående aktiviteter)</b>	
<u>Portørstue</u> Ingen aktivitet jf. plan	Eierskifte innen utgangen av 02.25
<u>Personalkantine</u>	Arealer ferdigstilt. OUS flytter inn stoler og bord
<b>R82 Sengeposter og akuttmottak E3/E4</b> Ferdigstillelse pågår. Eierskifte og innflytting noe utsatt. Pågår avklaring på nytt innflyttingstidspunkt	Eierskifte 11.24
<b>R83 Sengeposter i C2 og C4</b> Prosjektering og kontrahering av entreprenører pågår. Noen mindre avklaringer gjenstår. Utsatt igangsetting da vi ikke har tilgang til arealene ennå.	C2 eierskifte 12.24 01.25 C4 eierskifte 02.25 02.25
<b>R85 B2 – Dialyse, Nyrelab, hovedinngang</b> <u>B2, 1. etg. Prøvetaking, resepsjon, inngang</u> B2 1. etg har flere idriftsettelse. Prøvetaking ferdigstilles til 02.25, mens midlertidig hovedinngang ferdigstilles i koordinering med utomhus forplass II	Eierskifte (Prøvetaking) 02.25  Eierskifte hovedinngang under avklaring med forplass II. Tentativt primo mai 25.
<b>R86 Klinisk forskningspost</b> Prosjektering og kontrahering av entreprenører pågår. Ingen aktivitet jf. plan	Eierskifte 02.25
<b>R86 Elfys 5</b> Utføres av EIE Prosjektet. Bygningsmessig ferdig til årsskifte for deretter montering av maskin.	Eierskifte 02.25
<b>R87 Modulbygg tak C</b> Ferdigstilt. Pågår oppfølging av restanser.	
<b>R88 Modulbygg C7 (foreldreovernatting)</b> Søknad om igangsettingstillatelse er sendt. Produksjon av modulene er i gang.	Oppstart leieforhold og innflytting 11.24 12.24

# Status: mottaksprosjekt

OUS har vurdert at HLK ikke kan flytte til området E3/E4 helgen i uke 46, på grunn av stor usikkerhet rundt stabiliteten i de tekniske systemene

- Denne utsettelsen krever replanlegging av flyttingen av HLK, samt det neste delprosjektet, nevrologisk sengepost


Tentative flyttetidspunkt er desember 2024 for HLK og januar 2025 for nevrologisk sengepost

Det gjennomføres jevnlig statusmøter mellom OUS, Sykehuspartner og HSØ PO for å avklare tidspunkt for flytting og idriftsettelse

# ROKADE C1

## Overordnet plan

# 24/25

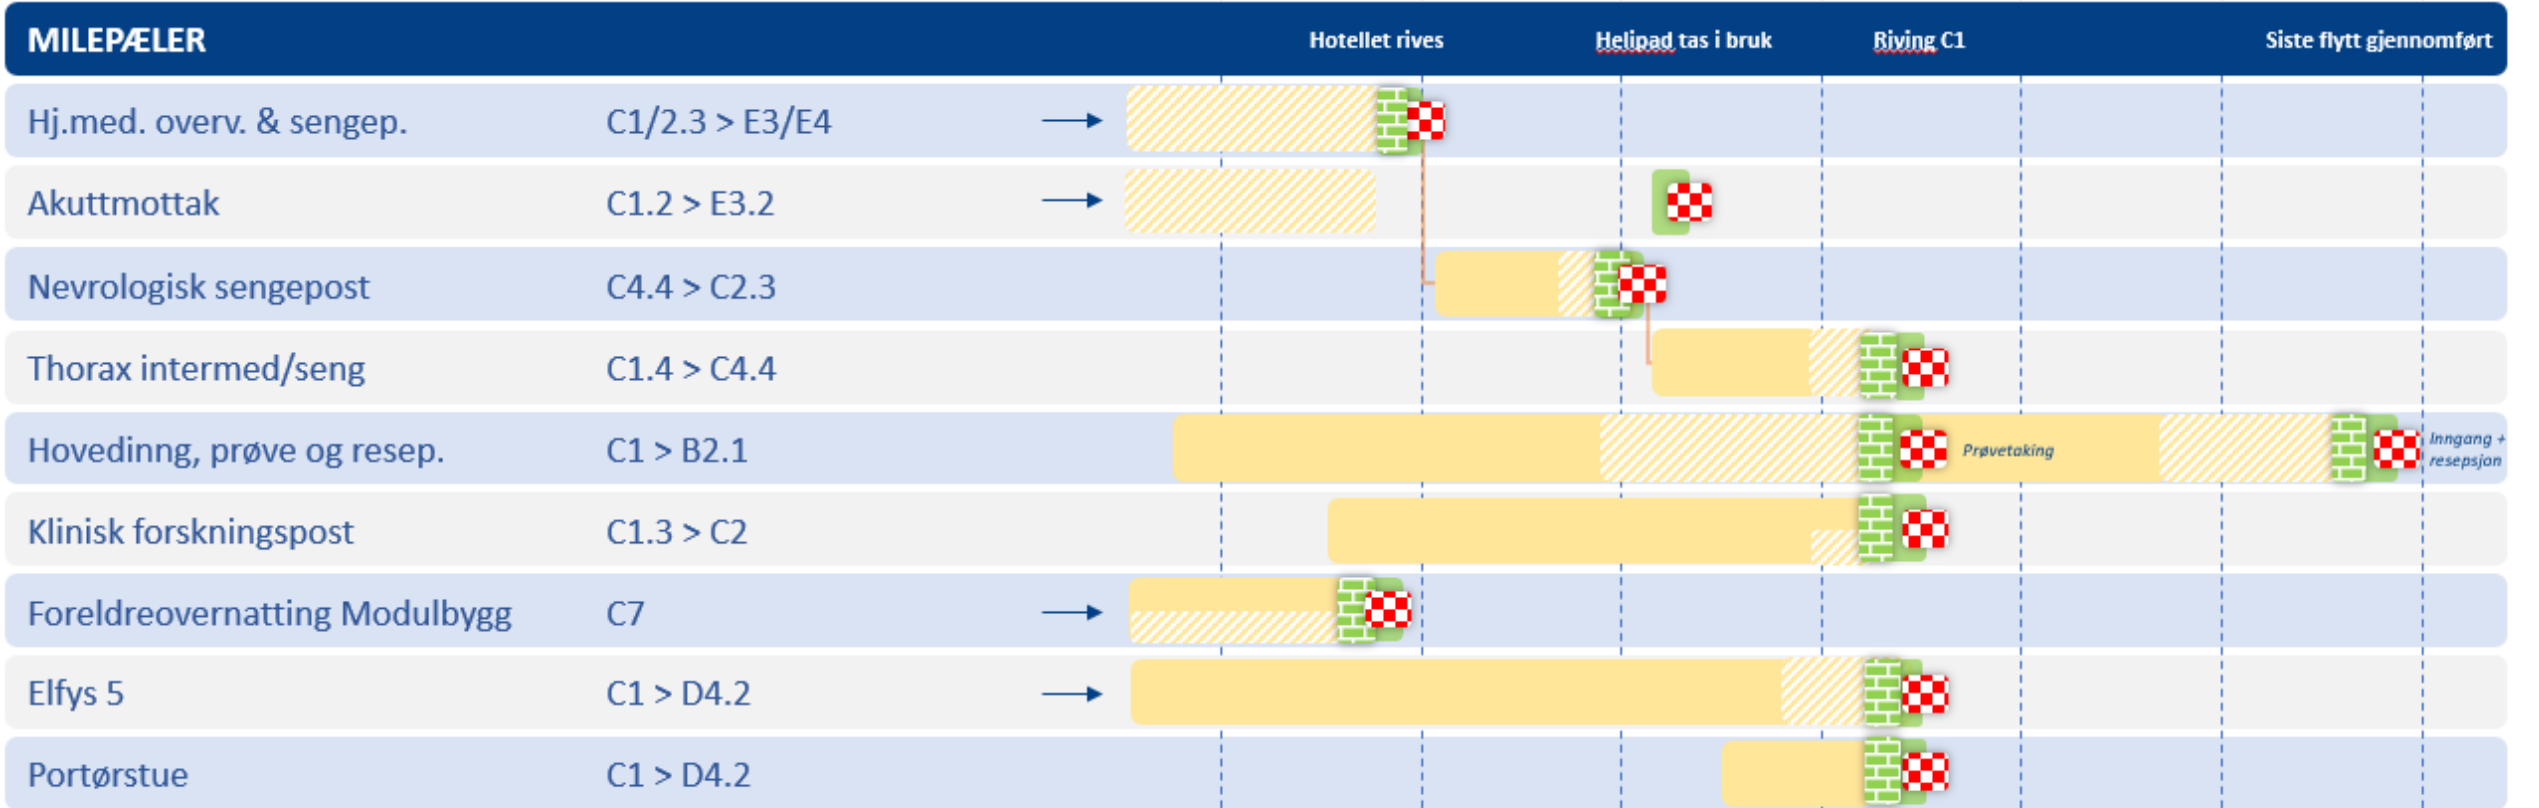


NB. Planrevisjon pågår, sist oppdatert 26. nov. 2024




# Avklaringer / særmøter - Portørstuen

I dag C1. 2 etasje merket blått

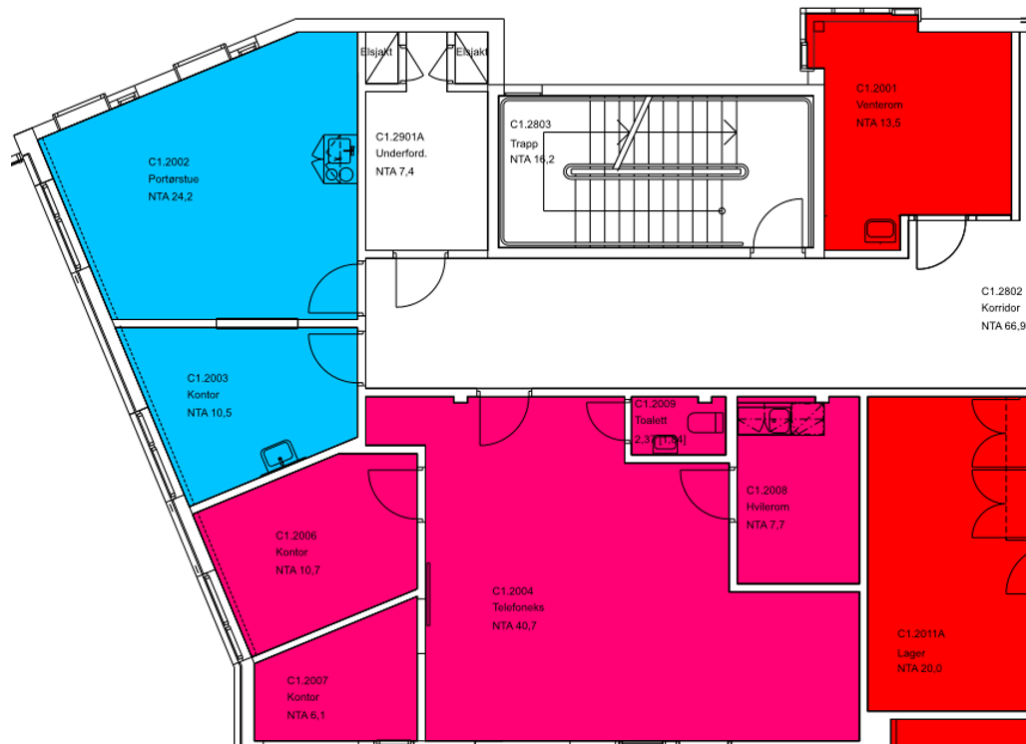



Ny løsning D4. 2 etasje merket gult

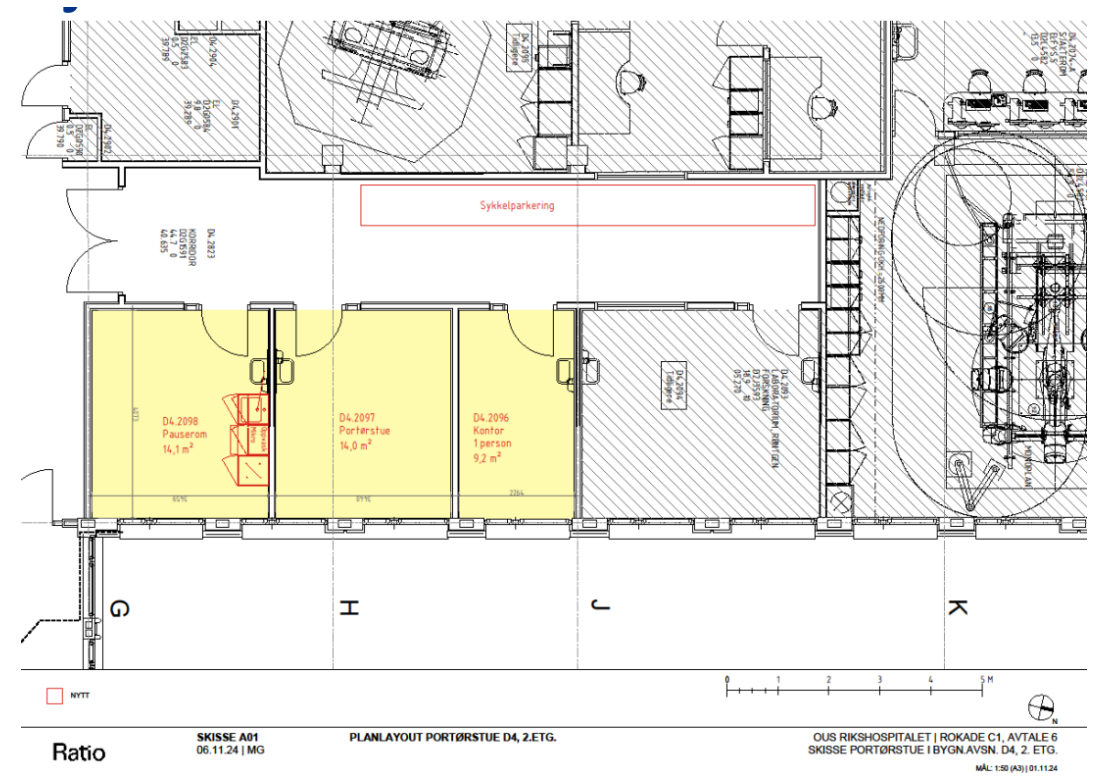



# Avklaringer / særmøter: Kantine

Kantineareal fase 2

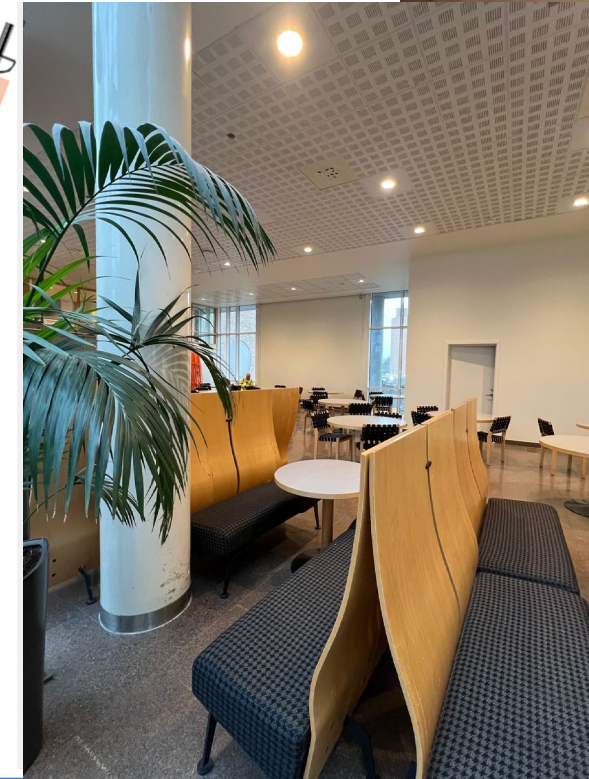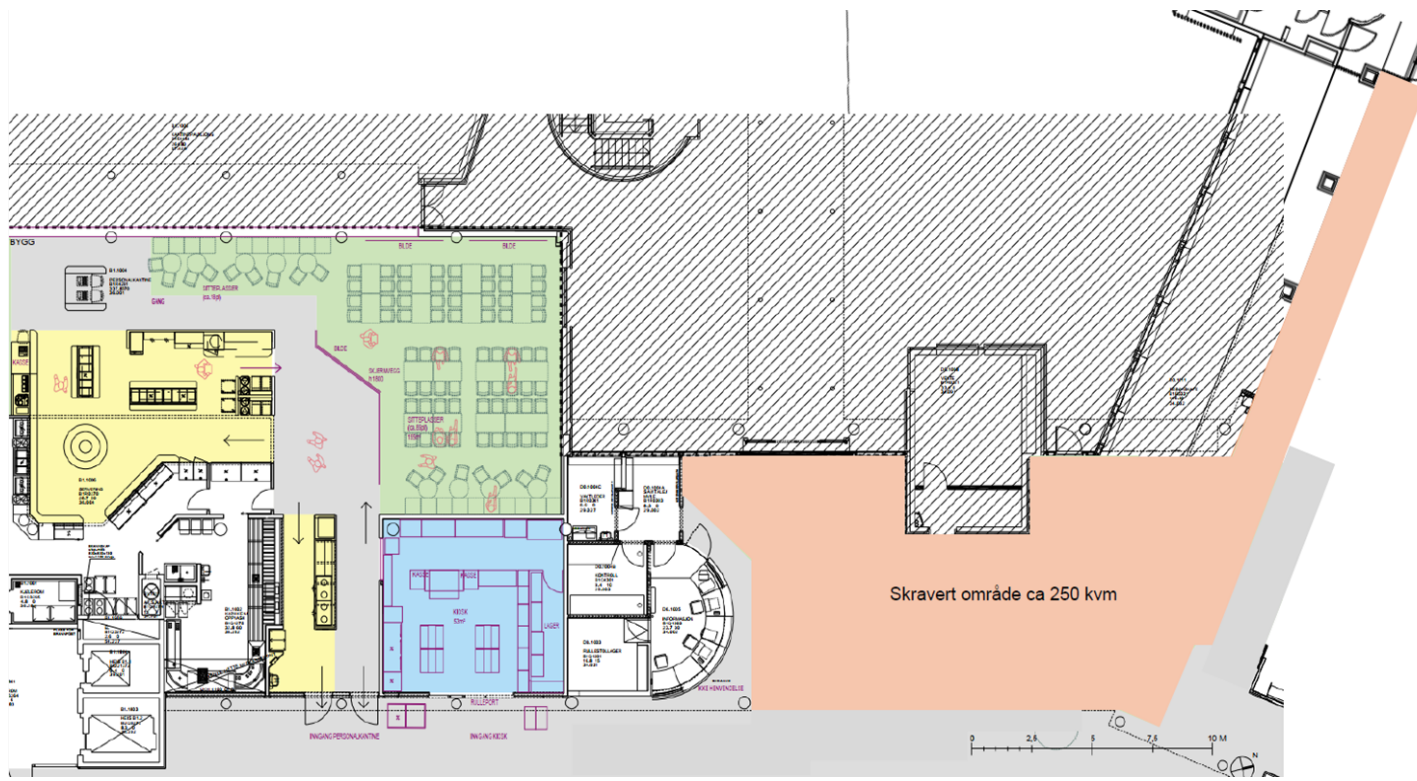

# Eventuelt

Alle oppdateringer om Rokade C1 legges hit:

[Nye Rikshospitalet – Hjem](#)

Alle referater/arbeidslogg fra medvirkning med HSØ PO legges ut hit:

[Medvirkning rokade C1 Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus HF](#)












## Rokade C1

 Sophie Frisholm Damsund  
Spesialrådgiver - adm

Rokade C1 ved Rikshospitalet innbefatter de rokader som må gjennomføres og det erstatningsareal som må fremskaffes før byggarbeidene på nye bygg kan startes opp. Arbeidet skal være gjennomført innen første kvartal i 2025. Prosjektet Rokade C1 har en stram tidsplan i forkant av riving av bygg C1. Gå inn på hvert delprosjekt under for å finne tidsplan for aktuelt prosjekt.

HLK flytter ikke inn i E3/E4 denne helgen (uke 46). Innflytting er utsatt på grunn av tekniske forhold. Ny dato for innflytting kommer i uke 47

### Prosjekter

 Akuttmottak Rikshospitalet	 Klinisk Forskningspost (KFP)	 Portørstue	 Foreldreovernatting modulbygg C7
 Thoraxkirurgisk intermedlær	 Neurologisk sengepost	 Kardiologisk intensiv overvåking og kardiologisk sengepost	 Midlertidig forplass 2
 Dialyse og nyrelab	 Hovedinngang og prøvetaking	 Elfys	



# Forberedende arbeid

Tema: **Rivearbeid C1** v/ Thea Koren, HSØ PO

Underlag rivearbeid C1 presenteres i møtet





# Eventuelt

