

Medvirkningsmøte forberedende arbeider og byggeplassskiller NRH

19.06.24

HELSE  SØR-ØST

Agenda forberedende arbeider og byggeplassskiller

14.45 – 15.30

Velkommen


- Status rivearbeider og arbeider i ulike entrepriser (byggeplass)
- Brann og rømning bygg E1
- Støy og rystelser
- Byggeplassskiller ved riving C1 og konsekvenser for drift
- Operativt koordineringsmøte ukentlig (OUS, UiO, HSØ PO)
- Evt.



Status rivearbeider

Forberedende arbeider og byggeplasskiller i bygg B1, D1 og E1

OBJEKTER SOM RIVES

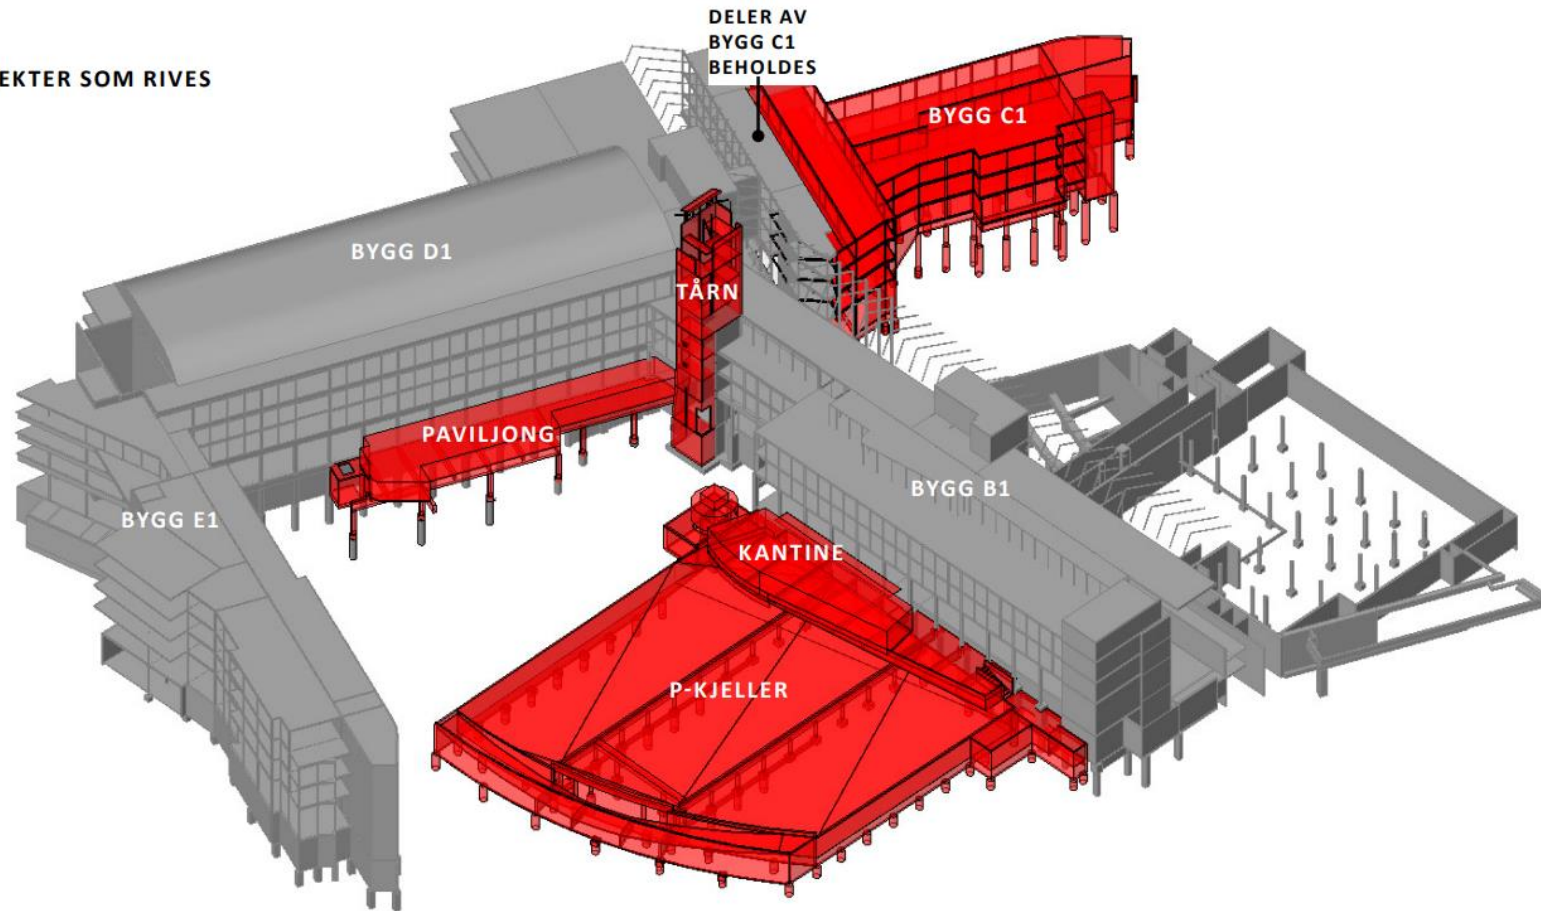

I tillegg planlegges rivearbeid for Gaustad hotell, oppstart 20.11.24.

Byggeplass J-bygget og sykehusparken



Status forberedende arbeider




Fra bygging av RH 1991-2001 Bygg E1

Dagens situasjon E1

Vi har en plate foran inngang E, som må fjernes før man får startet med rørspunt i uke 27.

Arbeidet vil starte mandag 17.juni og er forventet ferdig i løpet av ca.1,5 uke. Betongen vil bli skjært med betongsag og dratt ut fra vegg, før den klippes/tygges med maskin.

Støyskjerming etableres i forbindelse med skjæring.

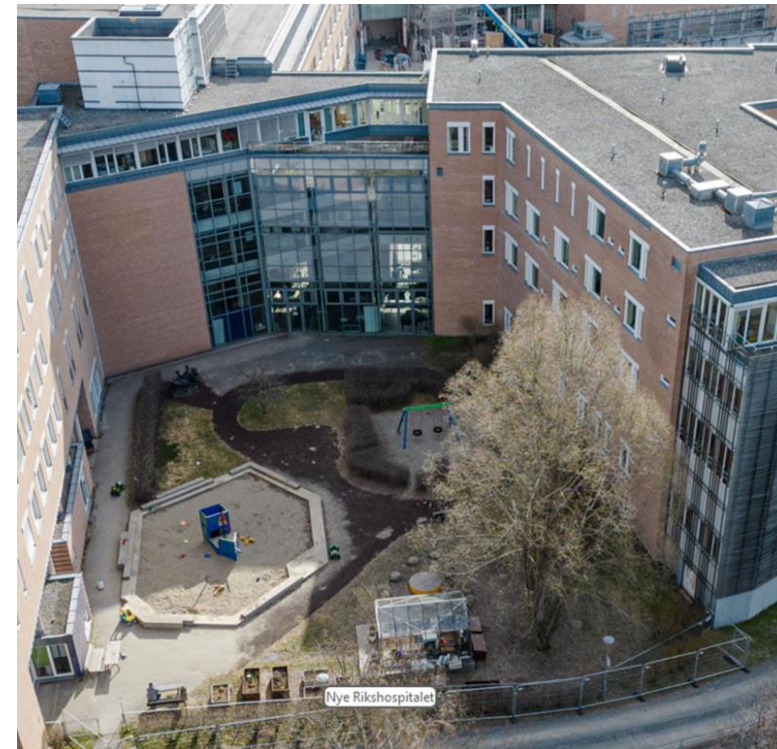

Arbeider utomhus vest for E-bygget

- Varevinduer monteres fortløpende fra mandag uke 26
- Provegger tas ned korridorer, glassgate og kantine
- Parkeringshus skal rives
- Fasade utvendig ferdigstilles (tårnet fjernet og ny fasade på plass)



Oppfølging fra medvirkningsgruppen: Utforme foliering eller lage noe for barn og ungdom i dette området (korridor fra glassgate til E-bygg)

Brann og rømning bygg E1


Det har pågått planer og blitt gitt informasjon tidligere i prosjektet om at det måtte endres brann og rømningsveier i bygg E1.

Det vil ikke bli ombygging av innvendige rømningsveier i bygg E mot sør, som tidligere prosjektert.

Eksisterende innvendige rømningsveier vil derfor være operative i hele byggeperioden, som inkluderer en trygg og sikret utvendig rømningsvei ut av byggeplass.»

BYGG E1 ETASJE 01

Nytt vindfang og rømningsvei

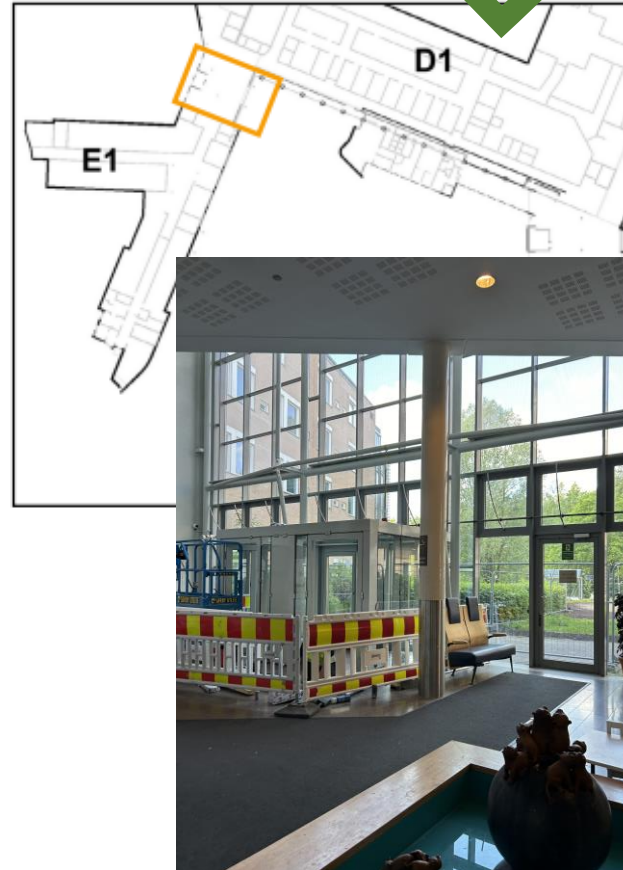

BYGG E1 ETASJE 01


Ny brannsluse og rømningsvei



Bygg J – grunnarbeid

Arbeid i neste periode
–Q3 blant annet:

- Sikringsarbeider mot eksisterende bygg E-D
- Boring av rørspunt,
- Riving P-hus
- Sprenging, transport og utgraving.

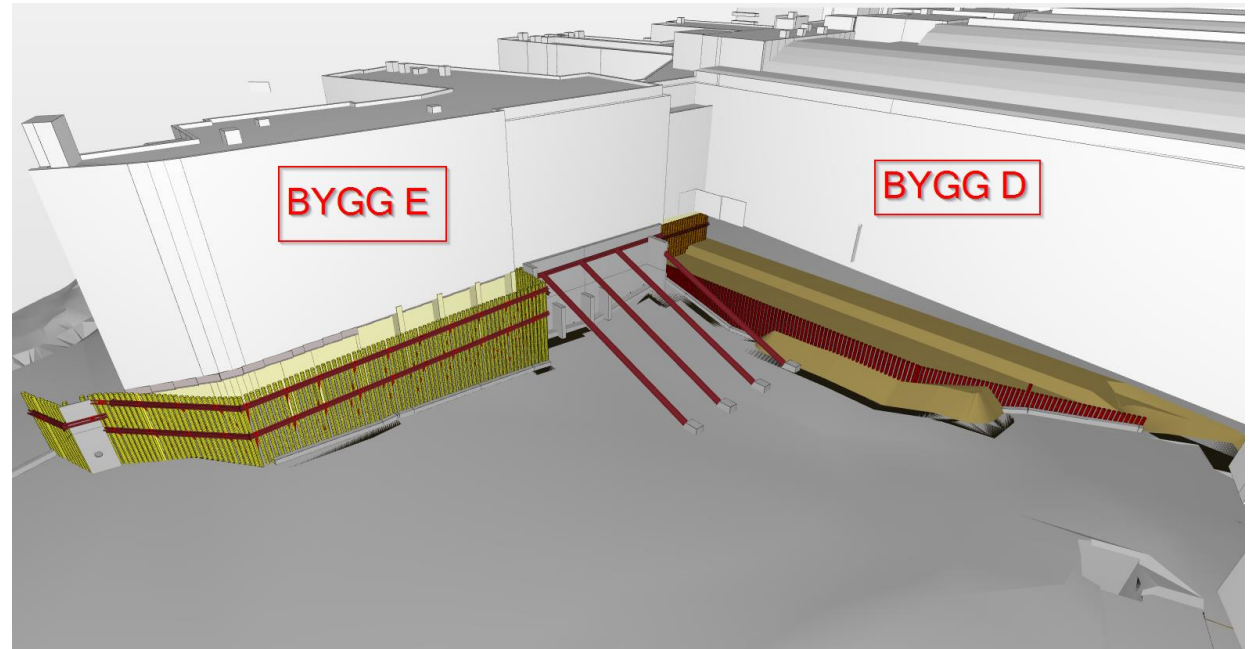


Tiltak: støyskjerming




Sprengning oppstart Q4 2024

- Arbeidsoperasjoner med forventet høyere vibrasjoner må koordineres mellom prosjektet og OUS
- Vibrasjon ved B1 avhenger av hvor sprengladningen sitter. Sprengning til høyre for midtaksen vil generere 15 mm/s
- Beregning av forventningsverdier kan gjøres på bakgrunn av utstyrs plassering
- 3 faste sprengningstidspunkter om dagen (+-5min). Tidspunkt skal avtales mellom OUS og HSØ-PO/Entreprenør

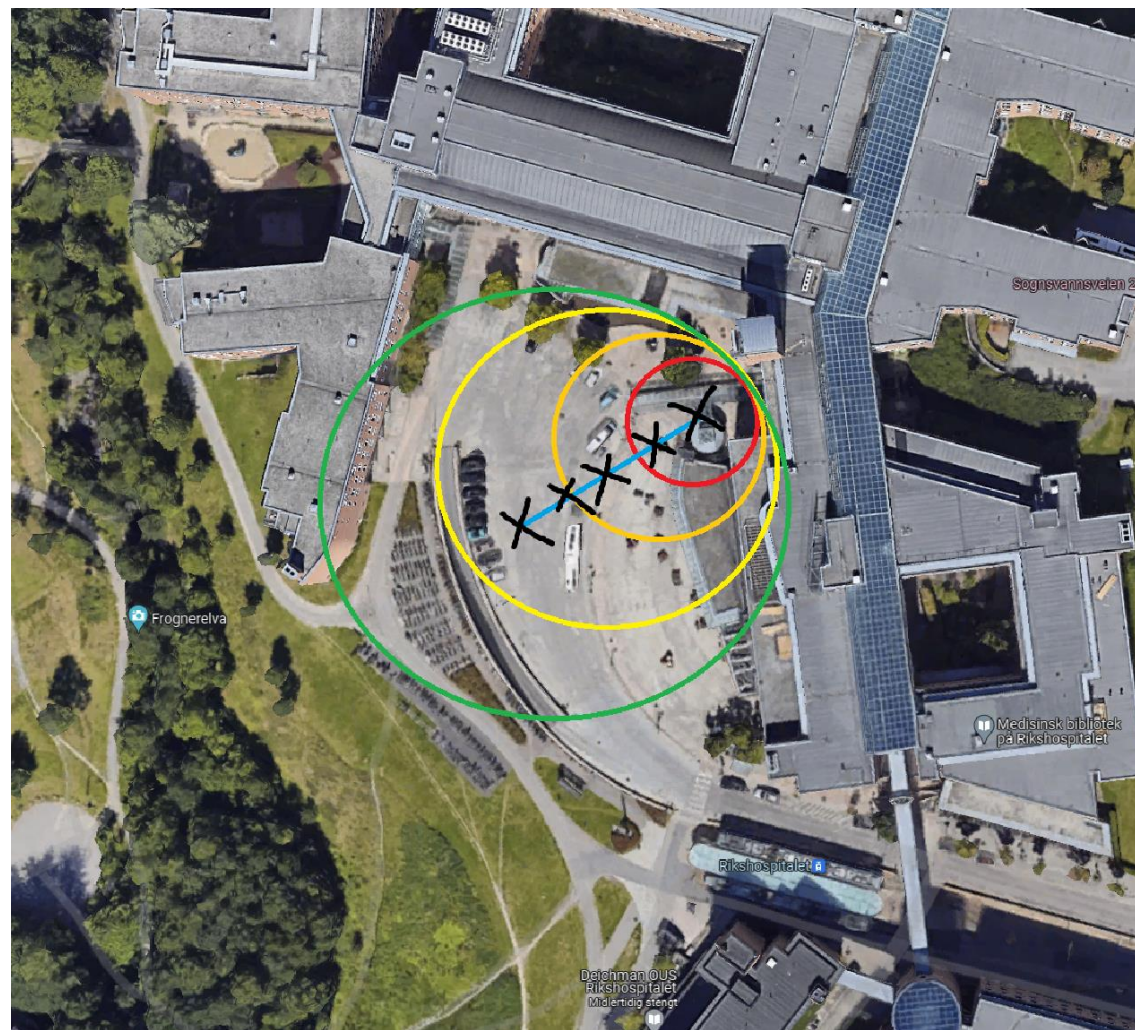


Sognsvannsveien

- Oppstart arbeider: Juni 2024
- Ferdigstillelse: Desember 2025
- Deler av traséen etableres midlertidig (ca. 6 år)
- Permanent trasé utføres senere som egen entreprise

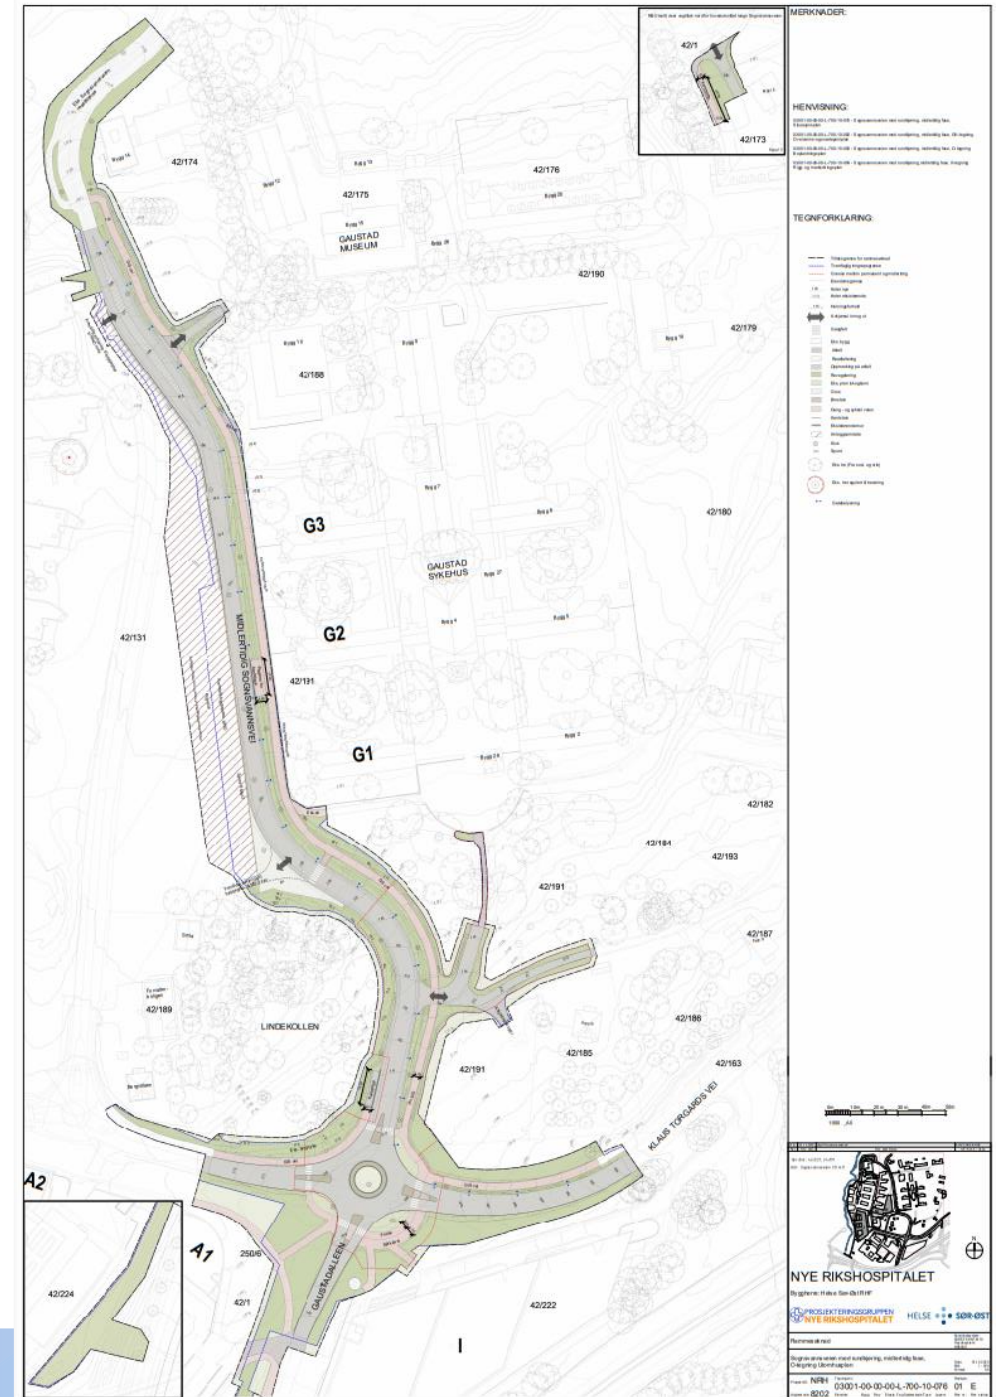

Midlertidig trikkeendeplass

- Oppstart arbeider: September 2024
- Ferdigstillelse: Januar 2025
- Midlertidig trikkeendeplass i Gaustadalleen (ca. 6 år)
- Permanent trikkeendeplass på Rikshospitalet utføres senere som egen entrepriser

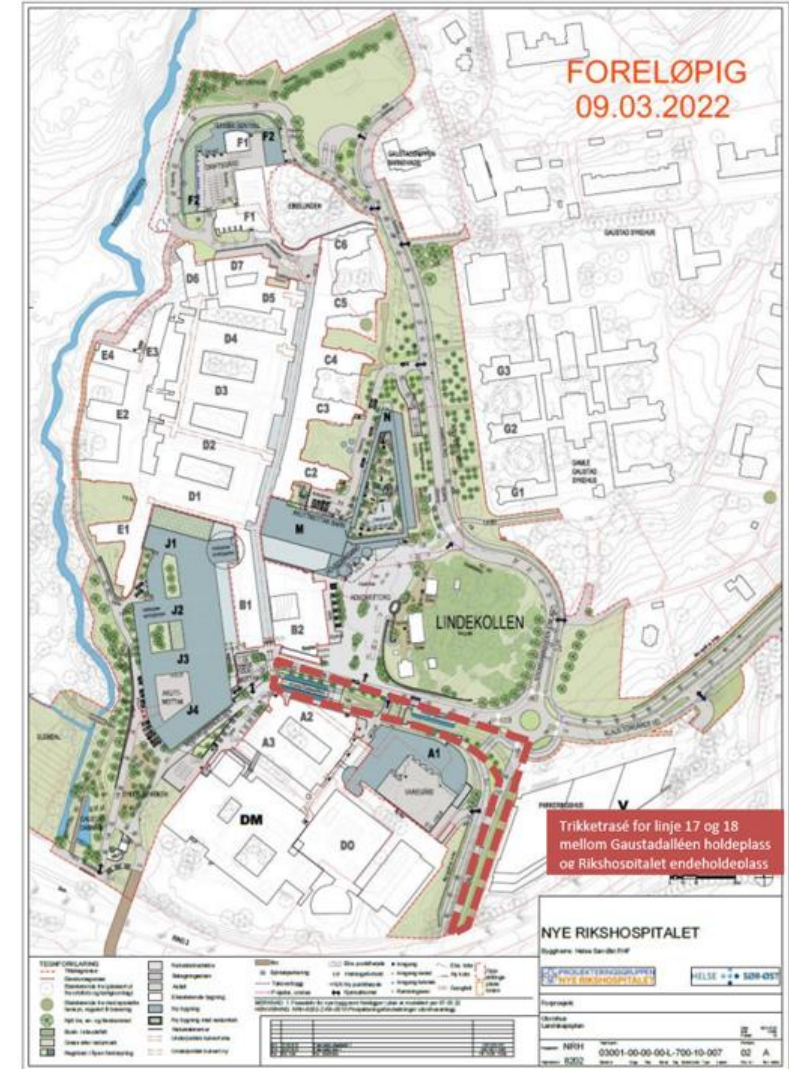

Rive C1 status med oppstart mars 2025



Eventuelt
