

Vedlegg 5 styresak 21/2021 - Risikobilde Sikkerhetspsykiatri

Bakgrunn

Ny sikkerhetspsykiatri avsluttet konseptfasen i 2017. Prosjektet er ikke videreført til forprosjekt i påvente av avklaring av reguleringsprosess i Bærum kommune. Beslutning om statlig regulering skaper forgang i reguleringsprosessen, slik at både programmet Ny sikkerhetspsykiatri og HSØ PO nå mobiliserer organisasjonen og nødvendige ressurser for videreføring til forprosjekt.

HSØ har godkjent Konseptrapporten og prioriterer etablering av etappe 1, dvs. Regional sikkerhetsavdeling (RSA) og Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri (KPS). Dette innebærer at det p.t. ikke foreligger beslutning i HSØ om etablering av etappe 2, som er virksomheten knyttet til lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og Regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme (PUA). Styret i OUS fattet i 2017 vedtak som fastslår samtidig etablering av etappe 1 og 2 som det beste alternativet både faglig og økonomisk.

Arbeid med risiko er påbegynt og det er så langt identifisert flere risikoområder i prosjektet. Risikoregister er etablert i Achilles. Risikounivers og Plan for risikostyring skal utarbeides og behandles i programstyret. Det er planlagt en workshop i programstyret for videre arbeid med risikoområder.

Tomt og regulering

- KMD overtar videre reguleringsprosessen etter vedtaket om statlig plan (HOD) som sikrer at Ny sikkerhetspsykiatri realiseres på Ila Sør, OUS og HSØ foretrukne tomtealternativ.
- Reguleringsplan ventes endelig vedtatt høsten 2021.

Virksomhetsinnhold


- Manglende beslutning i HSØ om samlet helhetlig utbygging etappe 1 og 2, samt finansiering av etappe 2.
- Pågående prosess om oppgavedeling innen lokal sikkerhetspsykiatri mellom OUS og sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet, avklaring forventes innen utgangen 2021.

Program for ibruktagelse

- Programstyret Ny Sikkerhetspsykiatri er konstituert, første møte avholdt 12.02.21. Programstyret ledes av klinikkleder Marit Bjartveit og består av sentrale ledere fra klinikken, økonomirådgiver, brukerrepresentant, to tillitsvalgte og verneombud.
- Påbegynt arbeid med usikkerhet/risiko og gevinstrealisering i samarbeid med klinikken
- Videre arbeid med avklaring av problemstillinger fra konseptfasen, reetablere medvirkningsprosessen og planlegging gjennomføring, mm.

Risikobilde med matrise

Figuren viser risikomatriksen for Ny sikkerhetspsykiatri øverst til høyre i figuren. Under figuren ligger de ulike usikkerhetene med kort beskrivelse. Disse er videre forklart senere i dokumentet.

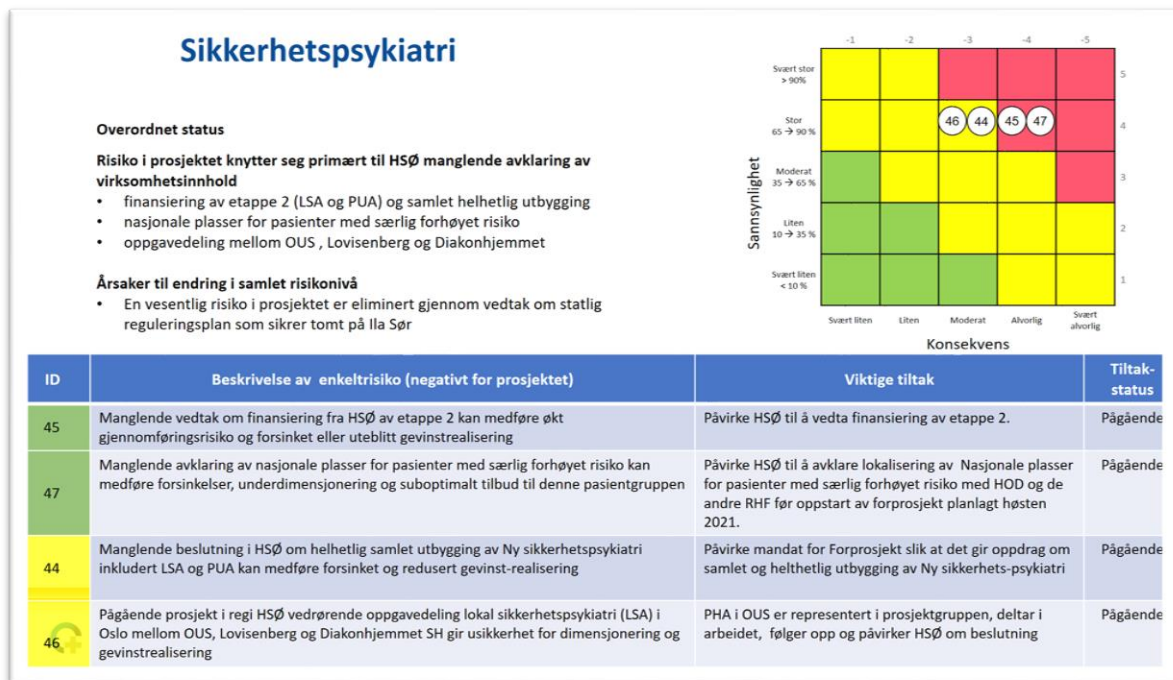

Figur 1 - Risikobilde Sikkerhetspsykiatri

#45 Manglende vedtak om finansiering fra HSØ av etappe 2 kan medføre økt gjennomføringsrisiko og forsinket eller uteblitt gevinstrealisering

Tiltak: Påvirke HSØ til å vedta finansiering av etappe 2.

#47 Manglende avklaring av nasjonale plasser for pasienter med særlig forhøyet risiko kan medføre forsinkelser, underdimensjonering og SUB optimalt tilbud til denne pasientgruppen

Tiltak: Påvirke HSØ til å avklare lokalisering av Nasjonale plasser for pasienter med særlig forhøyet risiko med HOD og de andre RHF før oppstart av forprosjekt planlagt høsten 2021.

#44 Manglende beslutning i HSØ om helhetlig samlet utbygging av Ny sikkerhetspsykiatri inkludert LSA og PUA kan medføre forsinket og redusert gevinst-realisering

Tiltak: Påvirke mandat for Forprosjekt slik at det gir oppdrag om samlet og helhetlig utbygging av Ny sikkerhets-psykiatri

#46 Pågående prosjekt i regi HSØ vedrørende oppgavedeling lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) i Oslo mellom OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet SH gir usikkerhet for dimensjonering og gevinstrealisering

Tiltak: PHA i OUS er representert i prosjektgruppen, deltar i arbeidet, følger opp og påvirker HSØ om beslutning
