


Byggherre ARH Q - Forskning og undervisning UiO og OUS - NRH		
Dato/tid: 19.11.2024 12:30	Lokasjon:	
Ansvarlig Ralf Kristensen		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møteserie, pulje 3.2 medvirkning i funksjonsprosjektet		Neste møte i serien 04.02.2025 12:30

Agenda

001 <input type="checkbox"/>	Agenda <ul style="list-style-type: none"> - Velkommen – presentasjon av deltagere i møtet v/HSØ PO - Hensikt med møte v/fagkoordinator - Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/gruppeleder <ul style="list-style-type: none"> Flyter som utsendt Andre flyter som medvirkningsgruppen ønsker å belyse - Oppsummering (punkter til arbeidslogg) - Veien videre - Eventuelt <p>WFL-108038: Møte 1 pulje 3.2 - T - Forskning og undervisning- NRH</p>
002 <input type="checkbox"/>	Deltagere Se vedlagt liste over deltagere i medvirkningsmøtet. 20241119DeltakeremedvirkningFoUpulje32.pdf
003 <input type="checkbox"/>	Status siden sist PG presenterte oppdaterte skisser for bygg M og N, med fokus på endringer siden forprosjektet.
004 <input type="checkbox"/>	Tilbakemeldinger på flyter Gjennomgang av rom tilhørende forskning og undervisning. Aksjonspunktene følger nedenfor. 20241120KliniskforskningsplassbarnogForskningstun_revidertskisse.pptx <p><u>19 nov 2024</u> Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025 Rom 15.02.049 Lager Etablere dører (2 stk.) inn til seminarrommet (i stedet for dør ut i korridor).</p> <p><u>19 nov 2024</u> Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025 Rom 14.02.054 og 14.02.52 Stillerom Gruppen ber om at ett av stillerommene deles i to mindre stillerom (samlet antall 3 stillerom).</p> <p><u>19 nov 2024</u> Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025</p>

Rom 14.02.045 Grupperom

Medvirkningsgruppen ønsker flere stillerom i denne sonen. PG vurderer om f.eks. dette rommet kan deles i to rom; grupperom (areal reduseres med areal til stillerom) og et lite stillerom (2 kvm).

19 nov 2024 **Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025**

Rom 15.02.026 Møte/seminarrom

Løsning med "fugleberg" vurderes som positivt. Medvirkningsgruppen ønsker enhet/bord med 8 plasser, fremfor 6 som vist nå. PG innarbeider dette (8 plasser). PG vurderer om rommet kan vris 90 grader, samt mulighet for inngang både foran og bak. Det skal også vurderes om rommet skal bytte plass med rom 15.02.027 for å sikre optimal, samlet løsning.

19 nov 2024 **Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025**

Rom 15.02.027 Møte/seminarrom

"Harvard" løsning. Medvirkningsgruppen viste til at det må være bord ved hver plass. PG vurderer løsningen. Diskusjon om arealet i bakkant (nord). PG vurderer:

- Etablering av lite grupperom/avlukke (ca. 5 kvm ifm disputas) og lager
- Om det kan etableres korridor fra vrimleområdet inn til dette grupperommet og lageret (ved å ta areal fra rom 14.02.040). Forutsatt at antall plasser og funksjon i seminarrom blir ivaretatt.
- Om det kan etableres dør fra disp rom (rosa farge), enten ut i korridor eller via i seminarrom 14.02.040

PG skal også se på muligheten for optimal bruk av arealet f.eks. om fugleberget og harvard kan bytte plass.

19 nov 2024 **Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025**

Rom 14.02.040 Møte/seminarrom

Medvirkningsgruppen ønsker et seminarrom med 2 nivåer (nivåforskjell, dvs. ikke flatt gulv). PG vurderer om dette er mulig, jfr. dører inn til teknikkrom.

19 nov 2024 **Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025**

Rom 15.02.025 Auditorium

PG vurderer følgende forhold:

- Muligheten for å etablere smal trapp også til venstre, og heller smalne de to andre trappene dersom mulig
- Ønske fra gruppen om knagger og hyller til å henge opp klær, annet (tas i neste møte)
- Ønske fra gruppen om bord ved hver stol, til f.eks. PC (ikke kun "kinosal")

19 nov 2024 **Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025**

Rom 15.03.003 Arbeidsrom tverrfaglig

PG vurderer muligheten for 4 arbeidsplasser. Arealet økes som følge av endret løsning for korridor/inngang til rommet og mindre stillerom (tilstøtende rom), se annet aksjonspunkt.

19 nov 2024 **Mette Berg Maastad frist: 13 jan 2025**

Rom 15.01.097 Stillerom

Stillerommet kan gjøres mindre (2 kvm) for å øke areal til tilstøtende arbeidsrom. Dør endres slik at den vender ut mot korridor.

19 nov 2024 **Trine Ertzeid frist: 26 nov 2024**

Klinisk forskningspost

Gruppeleder/fagkoordinator orienterte om at det er gjennomført særmøte med gruppen for poliklinikk om løsning for klinisk forskningspost på plan 03. Det foreligger alternative forslag til løsning. Bl.a. er det ikke behov for 2 laboratorier i området. OUS må gi tilbakemelding på eventuelle endringer knyttet til klinisk forskningspost og tilstøtende rom.

26 nov 2024

	<p>Stab utvikling har avholdt særmøte mellom medvirkningsgruppene Q FOU UiO/OUS og Z Poliklinikk og dagplasser barn/ungdom med utvalgte representanter. Det ble sendt ut en oppsummering etter møte med to alternativer for utforming av dette området. I etterkant har diskusjonen foregått på mail og det kom inn et tredje innspill fra representant fra KFP hvorpå UiO hadde noen innsigelser. Tilslutt endte man opp med to alternativer som er vist i vedlagte PP; "2024 11 20 Klinisk forskningspost barn og Forskningstun_revidert skisse" der alternativ 1 utformet av Stab Utvikling og alternativ 2 av KFP.</p> <p>Etter nye innspill på forelagte skisse fra KFP, UiO og medvirkningsgruppe Z, vurderer Stab Utvikling samlet at det er alternativ 1 som vil sikre den beste løsningen for de funksjoner som skal etableres i området. Forslag 2 innebar også at et undersøkelse og behandlingsrom (rom: 14.01.017) ble omgjort til et arbeidsrom, og det er ikke innenfor mandatet til medvirkning å ta ned antall kapasitetsbærende rom som et slik undersøkelsesrom nettopp er. Det er i forslaget fra Stab utvikling lagt inn mulighet for to arbeidsplasser i tillegg til undersøkelsesbenker i rommet og det legges med dette til grunn en fleksibel bruk. Det er den samme typen rom som etablert i ett av forskningstunene i bygg J. (Trine Ertzeid)</p>				
<p>005</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Tilbakemeldinger til andre flyter som gruppen ønsker å belyse</p> <p>Vrimleområde behandles i annen medvirkningsgruppen. Innspill fra denne gruppen skal derfor formidles videre.</p> <p><u>19 nov 2024</u> Trine Ertzeid frist: 26 nov 2024</p> <p>Formidle innspill til vrimleområde</p> <p>Medvirkningsgruppen viste til at foreliggende løsning med buen begrenser bruksmulighetene i vrimleområdet. Gruppen ønsker en mer åpen løsning som kan møbleres mer fritt for å sikre større fleksibilitet for å ivareta f. eks. utstillinger og servering. Løsningen må ivareta muligheten til å lade PC og telefon.</p> <p>26 nov 2024</p> <p>Stab Utvikling ber om at medvirkning for Vrimleområde 80.03.257 formelt legges til medvirkningsgruppe Q fom møte 2, dette da det er fagpersoner i denne gruppen som er de som skal bruke dette området i det daglige. Dette er ikke områder som er tilgjengelige for ansatte generelt i OUS i et velferdsperspektiv- du går ikke hit for å ta en hvil gjennom dagen, slik man tenker om velferd i kliniske områder. Dette er områder som vil ha en tilstrømming av mennesker både utenfra og internt fra sykehuset, det skal avholdes disputaser, fagmøter, undervisning, konferanser, utstilling av postere, noe enkel bevertning ifbm arrangementer osv- ergo det er fagpersoner i medvirkningsgruppen for forskning og undervisning som kjenner funksjonen i området og som best kan sikre at vrimleområdet utformes fleksiblet slik at det kan sikre alle funksjoner for området. (Trine Ertzeid)</p>				
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Status og veien videre</p> <p>HSØ PO orienterte kort om veien videre. Det etableres en aksjonslogg om oppfølgingspunkter.</p> <p>Neste medvirkningsmøte blir i uke 6, 2025.</p>				
<p>007</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker under eventuelt.</p>				
<p>Deltagere (avhuket = tilstede)</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mette Berg Maastad,</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ole Martin Semb, HELSE SØR-ØST RHF</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ralf Kristensen, HELSE SØR-ØST RHF</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Trine Ertzeid,</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Mette Berg Maastad,	<input checked="" type="checkbox"/> Ole Martin Semb, HELSE SØR-ØST RHF	<input checked="" type="checkbox"/> Ralf Kristensen, HELSE SØR-ØST RHF	<input checked="" type="checkbox"/> Trine Ertzeid,
<input checked="" type="checkbox"/> Mette Berg Maastad,	<input checked="" type="checkbox"/> Ole Martin Semb, HELSE SØR-ØST RHF				
<input checked="" type="checkbox"/> Ralf Kristensen, HELSE SØR-ØST RHF	<input checked="" type="checkbox"/> Trine Ertzeid,				

Forskning og undervisning UiO/OUS NRH

Klinikk	Navn	Rolle	Tilstede
OUS, KSM	Harriet Akre	Gruppeleder	
OUS, KVI	Anne Cathrine Staff	Fagperson	
OUS, MED	Anne-Marie Aas	Fagperson	x
OUS, HLK	Peder Langeland Myhre	Fagperson	x
UiO	Shuo-Wang Qiao	Fagperson	x
UiO	Knut Lundin	Fagperson	
OUS, OSS	Ida Helene Morgenstjerne Skard Heier	Fagperson	x
OUS, KSM	Michael Bretthauer	Fagperson	
OUS, BAR	Ketil Størdal	Fagperson	
OUS, TIK	Anders Johnsen	Fagperson utstyr/IKT	x
OUS, DST	Karin Borgen	Verneombud	x
OUS, DST	Matthias Kolberg	Verneombud	x
UiO	Bente Iren Hafstad Vasbotten	Verneombud Klinmed	x
OUS, DNLF	Einar August Høgestøl	Tillitsvalgt	x
OUS, NSF	Torunn Vigdal	Tillitsvalgt	x
OUS, Stab utvikling	Trine Ertzeid	Fagkoordinator	x
HSØ PO	Ralf Kristensen	Fasilitator	X
HSØ PO	Ole Martin Semb	Referent	x
HSØ PG	Berit Haugan	Utstyrsrådgiver	X
HSØ PG	Mette Berg Maastad	Arkitekt	X
HSØ PG	Karina Lehm	Arkitekt	X

Klinisk forskningspost barn og Forskningstun

Opprinnelig skisse



Klinisk forskningspost barn og Forskningstun

Alternativ 1- utformet av Stab Utvikling

Redusere stort stillerom til lite stillerom og dermed gjøre arbeidsrom større med inntil 4 plasser dersom arealet blir 24 kvm

Beholde kun ett laboratorium- UiO ønsker at dette beholdes

Endre laboratorium til arbeidsrom- sambruk mellom UiO og KPF

Etablere ett rom med plass til to hvilebenker/kombo. og 2 arbeidsplasser, dette ved å flytte 2 WC til andre siden a korridoren

Beholde dette ene rommet med seng, sette inn arbeidsplass.
LIVOPAN/avsug for gass


Dør ut i korridor fra stillerom

Brannsikre skap til KFP må inn på annet lager på poliklinikken

LIVOPAN/avsug for gass

Redusere rommene til opprinnelig 16 kvm og dermed kunne flytte to WC inn som innhukk i rom

Ett rom med tilgang WC fra rommet

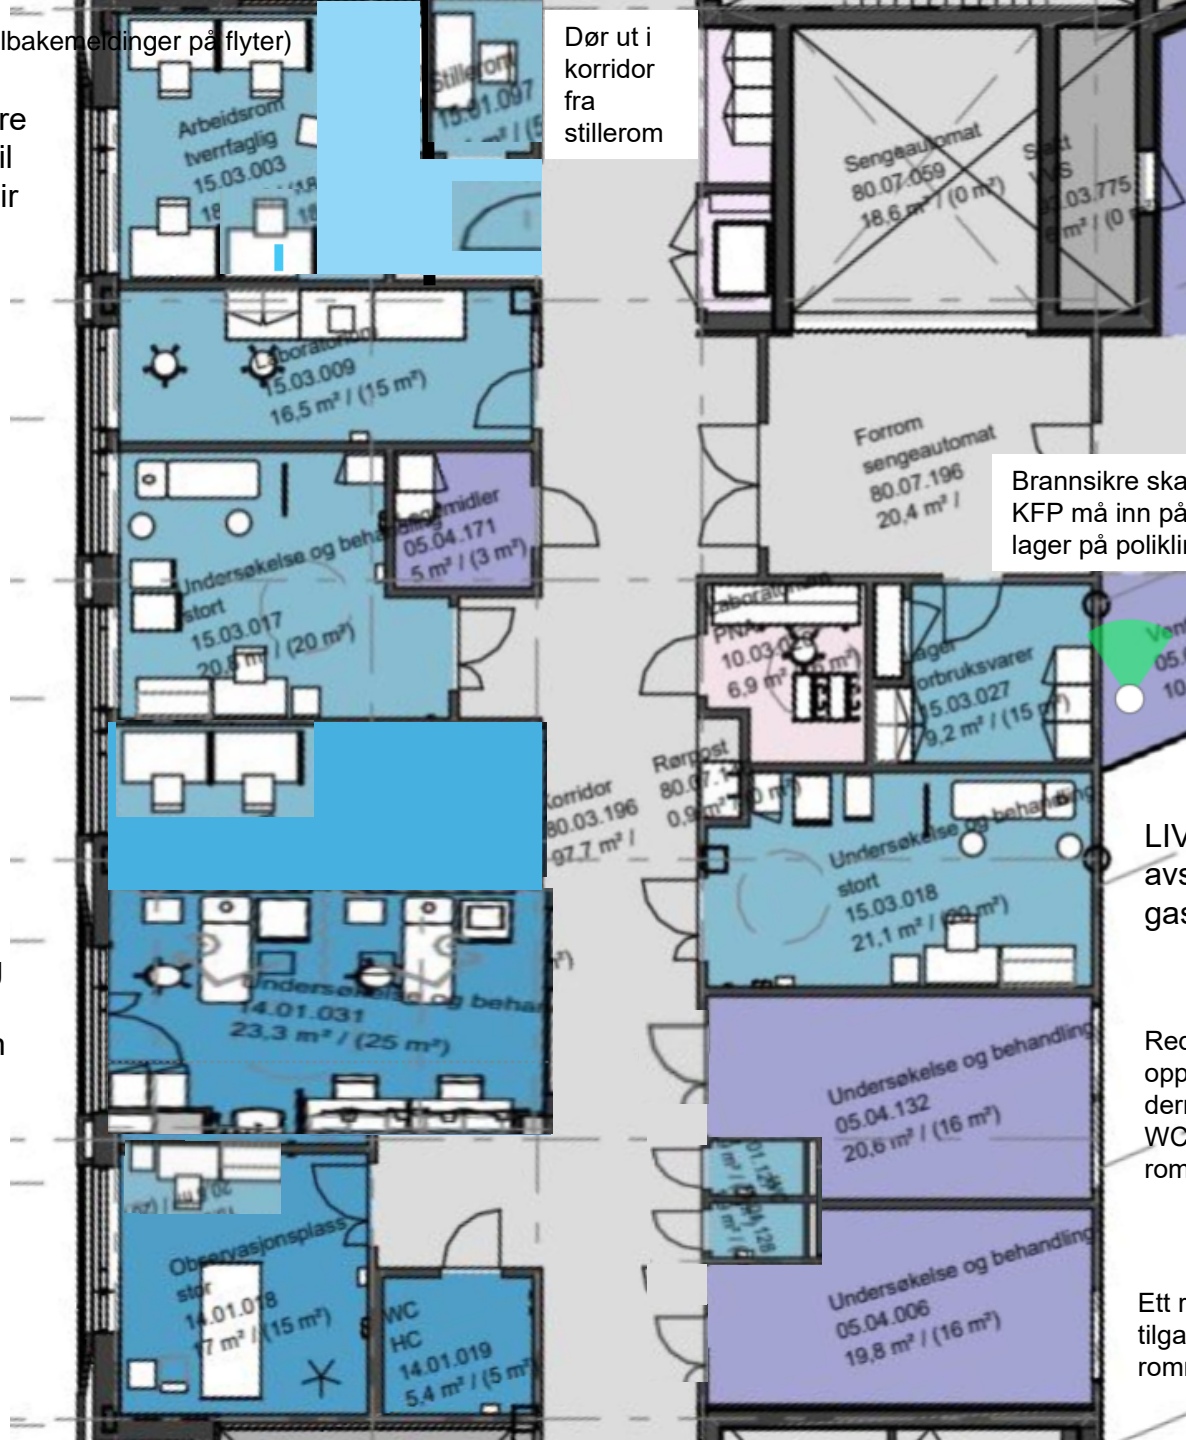

Klinisk forskningspost barn og Forskningstun

Alternativ 2 -etter innspill fra KFP

Redusere stort stillerom til lite stillerom og dermed gjøre arbeidsrom større med inntil 4 plasser dersom arealet blir 24 kvm

Beholde kun ett laboratorium-UiO ønsker at dette beholdes. Sambruk mellom UiO, FFP og andre i OUS

Endre laboratorium til arbeidsrom- sambruk mellom UiO og KFP

Omgjøre rommet til et arbeidsrom for KFP, samt sette inn skap for lagring av studiemateriell

Beholde dette ene rommet med seng, sette inn arbeidsplass. LIVOPAN/avsug for gass



Medvirkning funksjonsprosjektet

ARH/0000 - Byggherre ARH

Møte 1 pulje 3.2 - T - Forskning og undervisning- NRH

Møte 1 pulje 3.2 - T - Forskning og undervisning- NRH

Sak ID:

108038

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Ralf Kristensen

Opprettet

15.10.2024 10:48:14

Underlag og godkjenning

Completed by Ralf Kristensen, 05.11.2024 12:29:20

Underlag til medvirkningsmøtet klart til utsendelse.

[Ralf Kristensen 2024-10-15T10:48:53](#)

PG laster opp underlaget til medvirkningsmøtet

Completed By: Mette Berg Maastad 11/05/2024 09:46:14

Completed Comment: PG laster opp underlaget til medvirkningsmøtet

[Ralf Kristensen 2024-10-15T10:49:19](#)

PO laster opp agenda til medvirkningsmøtet

Completed By: Ralf Kristensen 11/05/2024 08:10:16

Completed Comment: PO laster opp agenda til medvirkningsmøtet

[Mette Berg Maastad - 2024-11-05T09:42:38](#)

[Ralf Kristensen - 2024-11-05T08:10:04](#)

[Ralf Kristensen - 2024-11-04T08:23:34](#)

[Ralf Kristensen - 2024-10-15T10:49:19](#)

PO laster opp agenda til medvirkningsmøtet

[Ralf Kristensen - 2024-10-15T10:48:53](#)

PG laster opp underlaget til medvirkningsmøtet

Logistikk medvirkning 2024.pdf

Gr. Q - Forskning og undervisning, møte 1.pptx

Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Elise Emilsen Bakke, 05.11.2024 13:06:02

Saksunderlag er distribuert til deltakere fra OUS.

Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

9001 - Rådgiver utstyr

8202 - Prosjektering NRH

0201 - Oslo universitetssykehus HF

Abonnenter:

Ralf Kristensen

Elise Emilsen Bakke

Trine Ertzeid

Mette Berg Maastad

Karina Lehm

Ole Martin Semb

Olav Bruflat
